



# CEFPAS

Centro per la Formazione


Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario



OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e  
riqualificazione dell'ingresso principale del CEFPAS  
mediante l'accesso diretto dalla via Luigi Monaco


PROGETTAZIONE

Ing. Giuseppe Galanti



E.P. INGEGNERIA  
Associati

Viale della Regione, 6  
93100 Caltanissetta  
Tel. 0934552113  
email-epingegneria@tiscali.it

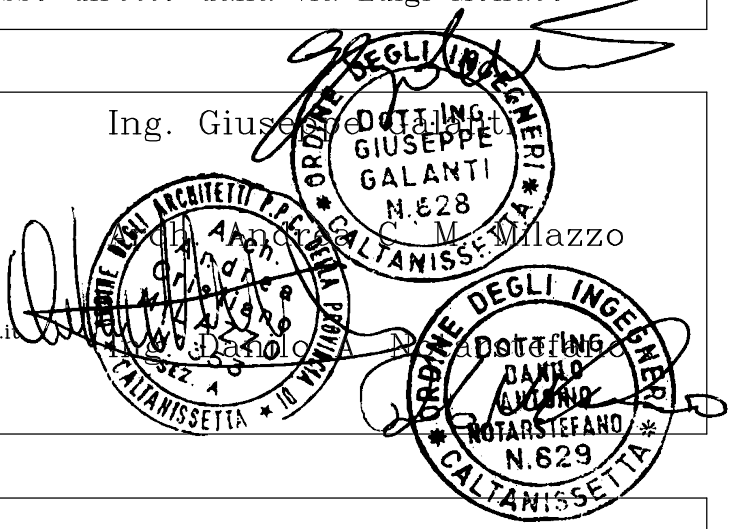

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1^ STESURA	REVISIONI		
Luglio 2020	03 agosto 2020		

R.U.P.: Ing. Corrado Persico



**Progetto Esecutivo dei Lavori di sistemazione e riqualificazione dell'ingresso principale del CEFPAS mediante l'accesso diretto dalla via Luigi Monaco**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Per i lavori di che trattasi si procederà con la demolizione della recinzione esistente, con i movimenti di terra strumentali alla realizzazione del nuovo tracciato stradale. Si tratteranno quindi le opere d'arte afferenti la recinzione, la fondazione del cancello e della barra ed i muri di contenimento della piattaforma stradale. Si provvederà a realizzare le carpenterie ed a gettare il calcestruzzo per le opere in c.c.a., ed all'esito della stragionatura ad effettuare i reinterri creando le scarpate stradali. Si procederà ad interrare la condotta per le acque bianche, con pozzetti e caditoie, ed a realizzare i cavidotti e i pozzetti per l'impianto di illuminazione.

Al termine si provvederà a realizzare la sottostruttura stradale e la relativa pavimentazione.

Si metterà in opera il cancello, la barra e la guardiola e verranno eseguite le opere di rivestimento e di finitura.

L'opera verrà completata con la sistemazione del verde e dell'impianto di irrigazione.

La durata del cantiere è prevista in mesi quattro.

Di seguito il cronoprogramma.

- 1) Allestimento del cantiere con posizionamento baraccamenti

Da gg 0 a gg 3

- 2) Demolizione recinzione esistente

Da gg 4 a gg 7

- 3) Movimenti di terra (compresi scavi a sezione obbligata)

Da gg. 8 a gg 15

- 4) Tracciamenti opere d'arte

Da gg. 16 a gg. 20

- 5) Realizzazione carpenterie muri di contenimento strada, fondazione cancello e barra e getto calcestruzzi

Da gg. 21 a gg. 55



- 6) Realizzazione scavi condotta acque bianche e predisposizione impianto di illuminazione stradale

Da gg. 56 a gg. 65

- 7) Realizzazione reinterri e formazione scarpate stradali

Da gg. 66 a gg. 75

- 8) Messa in opera condotta acque bianche con pozzetti e caditoie e pozzetti impianto di illuminazione

Da gg. 76 a gg. 85

- 9) Realizzazione di sottostruttura stradale, binder e tappetino

Da gg. 86 a gg. 95

- 10) Messa in opera cancello, barra e guardiola, esecuzione opere di finitura, realizzazione verde ed impianto di irrigazione

Da gg. 96 a gg. 120

