



CEFPAS



REGIONE SICILIANA

Responsabile Unico del Procedimento

Progettista

Ing. Michele Speciale



OPERE INTERNE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PADIGLIONI 3 E 11

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| C | L | C | P | E | T | C | R | 1 | 005 | 01 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|

CODE


DRAWING N.

SCALE


—

FILE-NAME_EXTENSION

| N. ordine | Codice | Cronoprogramma lavori | Inizio | Durata gg. |
|-----------|--------|--|--------|------------|
| | | FASI | | |
| 1 | 1 | Installazione Impianti di Cantiere | 1 | 2 |
| 2 | 2 | Posa in opera recinzione | 2 | 2 |
| 3 | 3 | Demolizioni pavimenti | 3 | 15 |
| 4 | 4 | Dismissione di circa 100 m ² di manto impermeabile della copertura dell'Hotel | 17 | 15 |
| 5 | 5 | preparazione del piano di posa | 32 | 7 |
| 6 | 6 | Spalmatura di primer bituminoso | 36 | 7 |
| 7 | 7 | Stesura di circa 100 m ² di manto prefabbricato impermeabilizzante | 39 | 20 |
| 8 | 8 | Rimozione pannelli in cartongesso | 17 | 15 |
| 9 | 9 | Rimozione pannelli in fibra minerale | 32 | 7 |
| 10 | 10 | Posa in opera pannelli di controsoffitto in fibre minerali | 36 | 7 |
| 11 | 11 | Posa di massetto | 39 | 20 |
| 12 | | Rivestimenti | 57 | 15 |
| 13 | | Intonaci | 71 | 10 |
| 14 | | Tinteggiatura | 80 | 8 |
| 15 | | Sgombero e trasporto a discarica dei materiali di risulta | 86 | 3 |

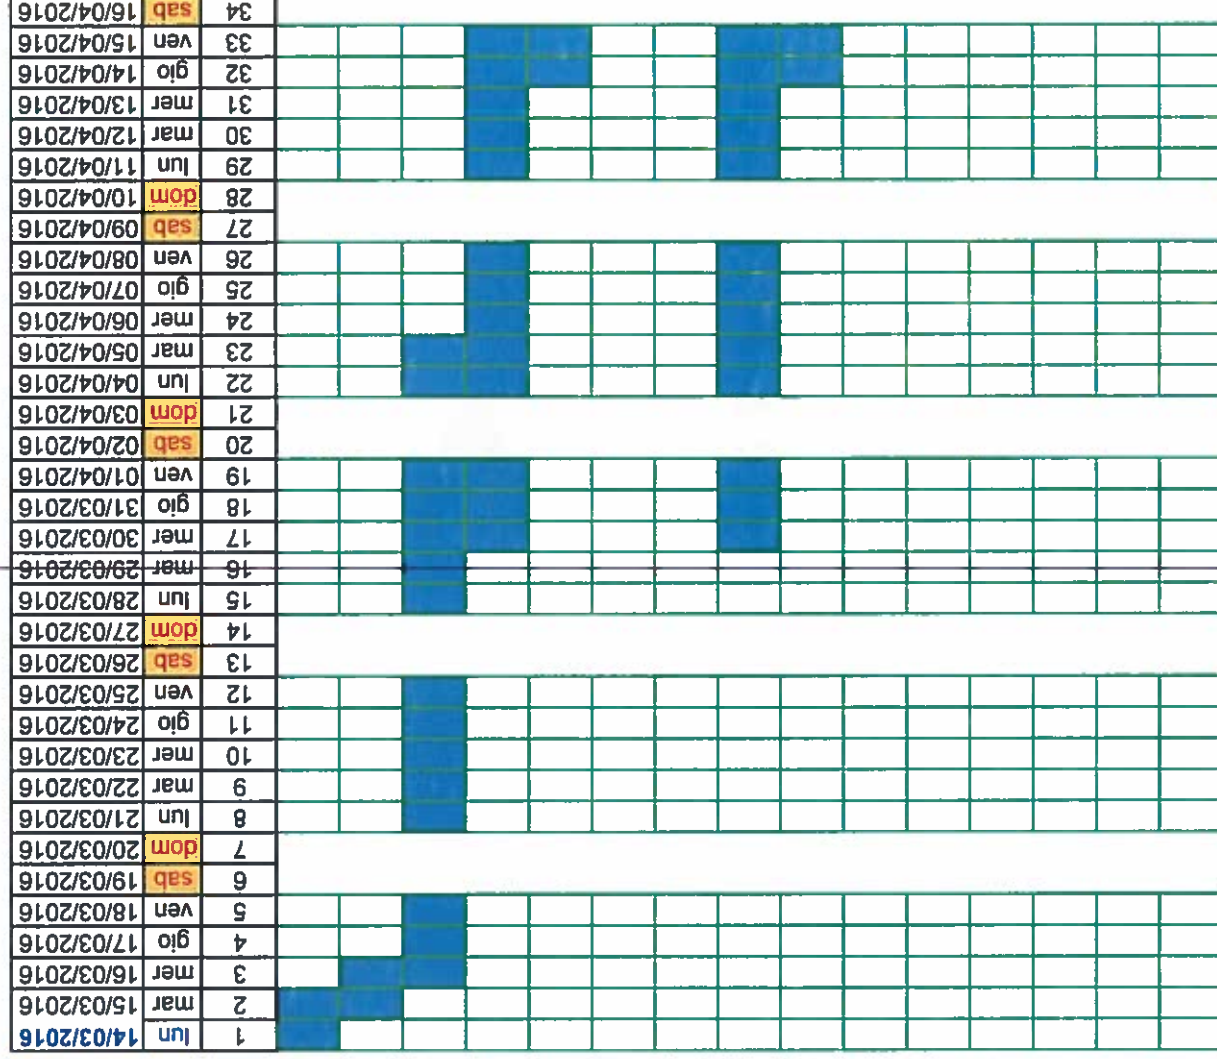

| N. ordine | Codice | Cronoprogramma lavori | | Durata gg. |
|-------------|--------|--|----|------------|
| | | Inizio | | |
| FASI | | | | |
| 1 | 1 | Installazione Impianti di Cantiere | 1 | 2 |
| 2 | 2 | Posa in opera recinzione | 2 | 2 |
| 3 | 3 | Demolizioni pavimenti | 3 | 15 |
| 4 | 4 | Dismissione di circa 100 m ² di manto impermeabile della copertura dell'Hotel | 17 | 15 |
| 5 | 5 | preparazione del piano di posa | 32 | 7 |
| 6 | 6 | Spalmatura di primer bituminoso | 36 | 7 |
| 7 | 7 | Stesura di circa 100 m ² di manto prefabbricato impermeabilizzante | 39 | 20 |
| 8 | 8 | Rimozione pannelli in cartongesso | 17 | 15 |
| 9 | 9 | Rimozione pannelli in fibra minerale | 32 | 7 |
| 10 | 10 | Posa in opera pannelli di controsoffitto in fibre minerali | 36 | 7 |
| 11 | 11 | Posa di massetto | 39 | 20 |
| 12 | | Rivestimenti | 57 | 15 |
| 13 | | Intonaci | 71 | 10 |
| 14 | | Tinteggiatura | 80 | 8 |
| 15 | | Sgombero e trasporto a discarica dei materiali di risulta | 86 | 3 |

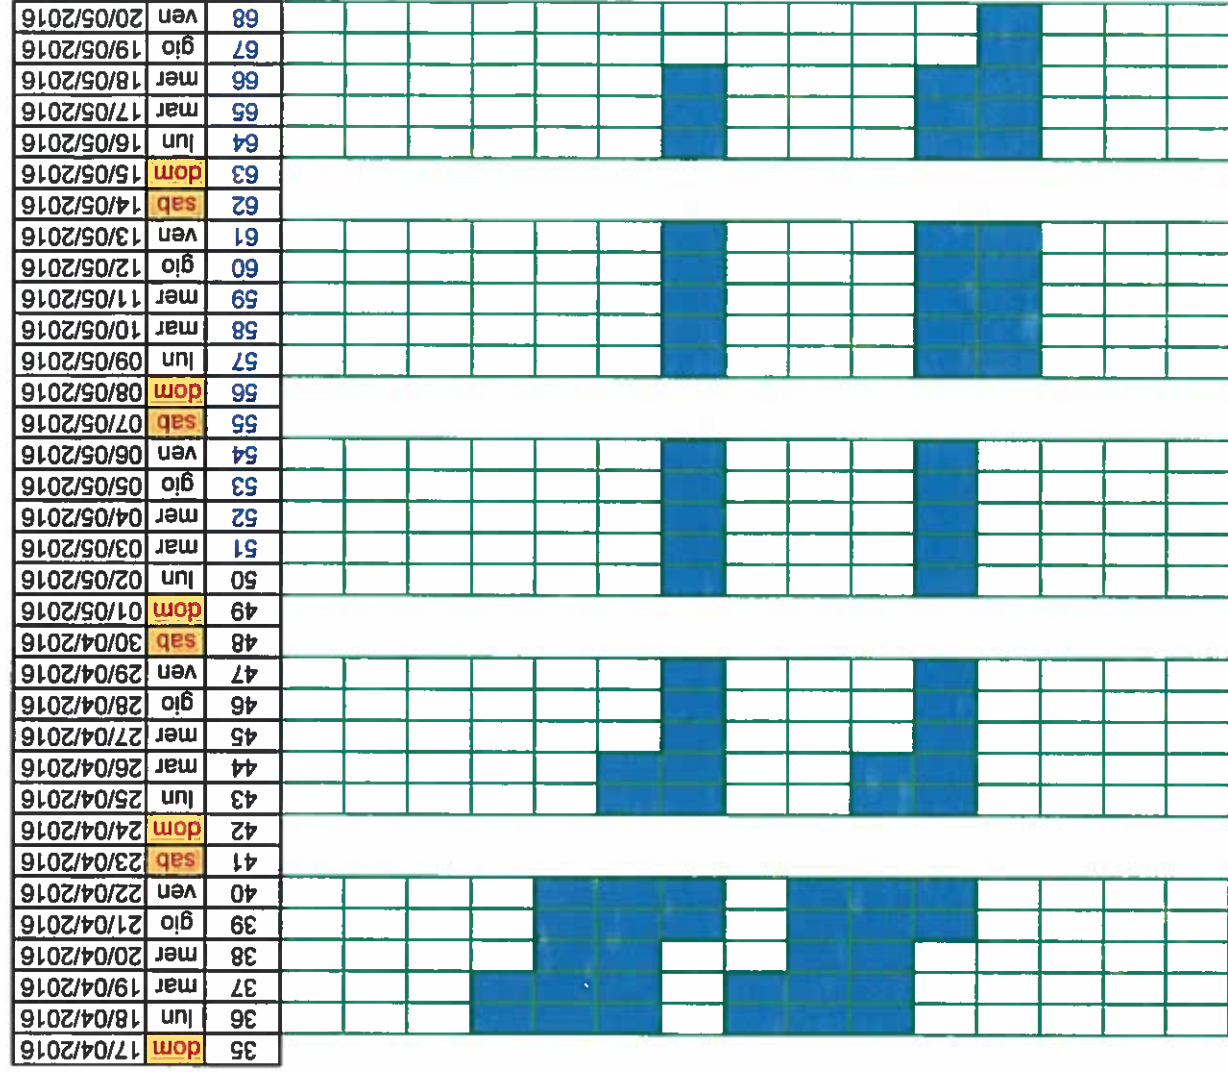

| N. ordine | Codice | Cronoprogramma lavori | Inizio | Durata gg. |
|-------------|--------|--|--------|------------|
| FASI | | | | |
| 1 | 1 | Installazione Impianti di Cantiere | 1 | 2 |
| 2 | 2 | Posa in opera recinzione | 2 | 2 |
| 3 | 3 | Demolizioni pavimenti | 3 | 15 |
| 4 | 4 | Dismissione di circa 100 m ² di manto impermeabile della copertura dell'Hotel | 17 | 15 |
| 5 | 5 | preparazione del piano di posa | 32 | 7 |
| 6 | 6 | Spalmatura di primer bituminoso | 36 | 7 |
| 7 | 7 | Stesura di circa 100 m ² di manto prefabbricato impermeabilizzante | 39 | 20 |
| 8 | 8 | Rimozione pannelli in cartongesso | 17 | 15 |
| 9 | 9 | Rimozione pannelli in fibra minerale | 32 | 7 |
| 10 | 10 | Posa in opera pannelli di controsoffitto in fibre minerali | 36 | 7 |
| 11 | 11 | Posa di massetto | 39 | 20 |
| 12 | | Rivestimenti | 57 | 15 |
| 13 | | Intonaci | 71 | 10 |
| 14 | | Tinteggiatura | 80 | 8 |
| 15 | | Sgombero e trasporto a discarica dei materiali di risulta | 86 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 69 | sab | 21/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | dom | 22/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | lun | 23/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | mar | 24/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | mer | 25/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | gio | 26/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ven | 27/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | sab | 28/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | dom | 29/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | lun | 30/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | mar | 31/05/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | mer | 01/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | gio | 02/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | ven | 03/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | sab | 04/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | dom | 05/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | lun | 06/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | mar | 07/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | mer | 08/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | gio | 09/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ven | 10/06/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
